

# Etablissement Public Territorial de Bassin Orb et Libron


## Travaux de Protection contre les inondations De la Commune de Sérignan

POINT D'AVANCEMENT SUR LA T3 DE L'OPERATION

# Protection rapprochée de Sérignan

## Points clefs :

- Budget global opérationnel : 7 M € HT
- Subventionnés à 80 % par le PAPI (Etat, Région, CD34)
- Autorisé / Déclaré d'utilité publique / Classé type B : Août 2014
- Réalisé en plusieurs tranches opérationnelles :
  - T0 : 630 000 € HT (2015)
  - T1 : 2 M € HT (2016)
  - T2 : 2 M € HT (2019)
  - T3 : 2,4 M € HT (en cours)

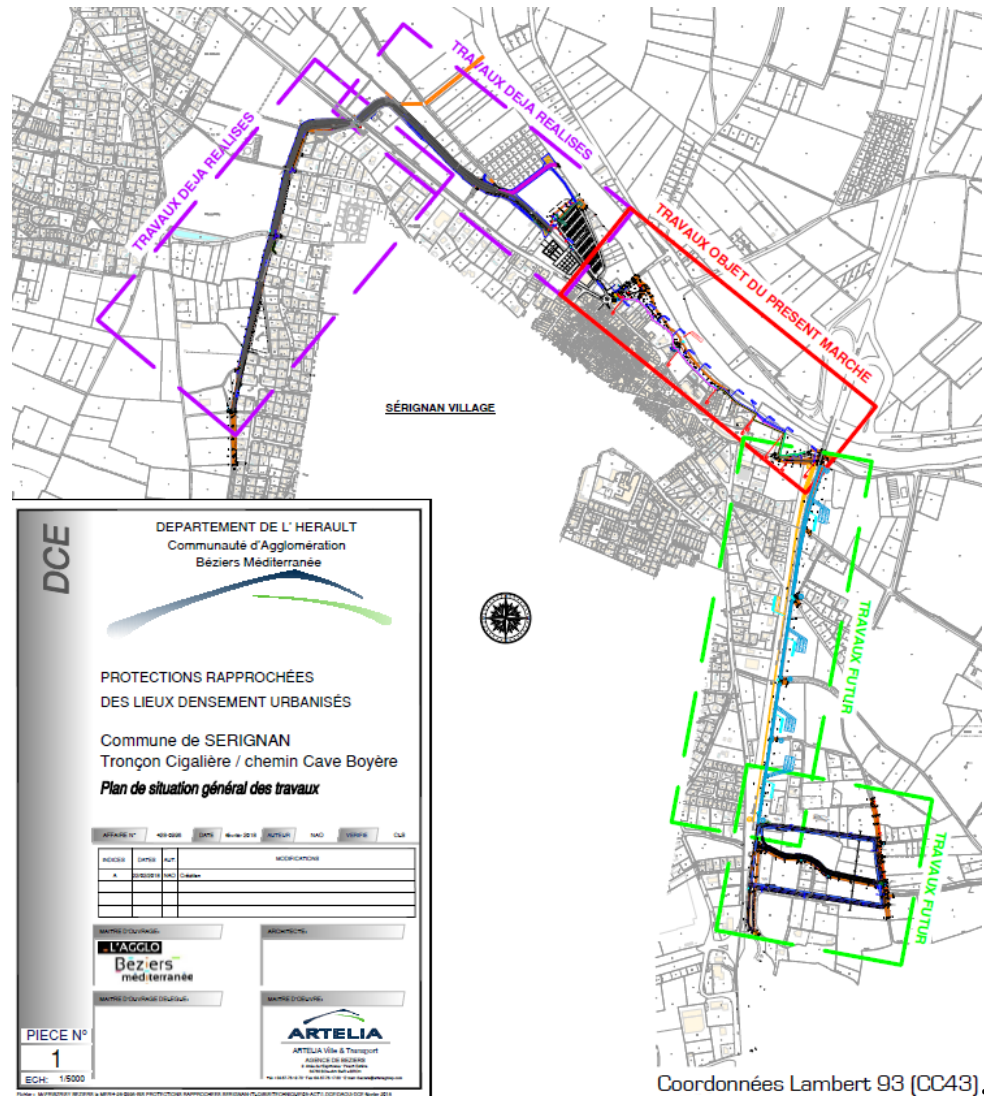

# Protection rapprochée de la commune de Sérignan : T1



## Points clefs T1 :

- **Marché**  
**CAZAL/Guintoli :**  
**1 650 000 € HT**
- **Réalisé de juillet**  
**2015 à Avril 2016.**



## Partenaires financiers des opérations

# Protection rapprochée de la commune de Sérignan : T1




Partenaires financiers des opérations

# Protection rapprochée de Sérignan tranche n°2

## Points clefs :


- Budget opérationnel :  
2 000 000 € HT
- Subventionnés à 80 % par le PAPI (Etat, Région, CD34)
- Déléguée par la CABM à l'EPTB
- Déroulement :
  - Ouverture chantier courant Avril 2019
  - Finalisation Chantier Février 2020

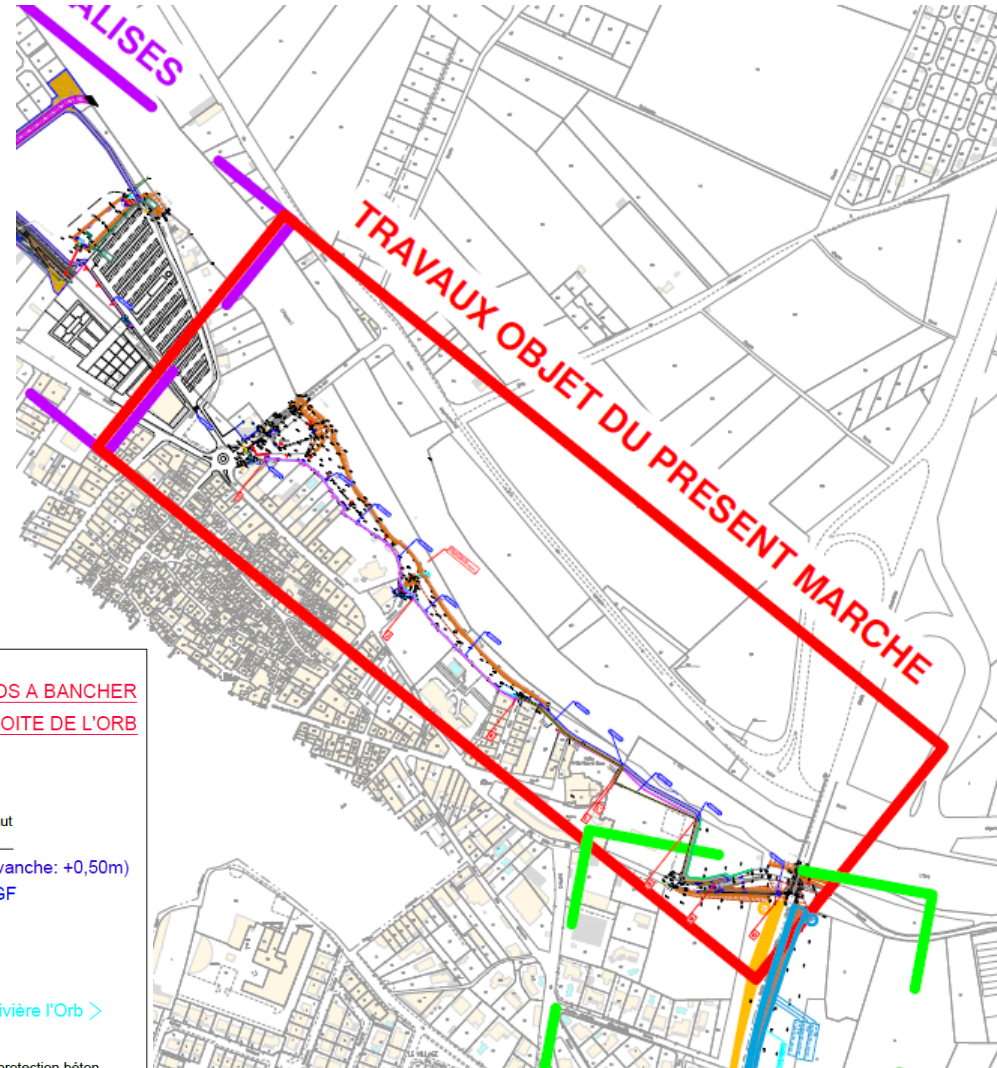

OUV N°13

Coupe de principe D-D

OUVRAGE N° 13 - CONTRE-MUR EN AGGLOS A BANCHER  
RIVE DROITE DE L'ORB

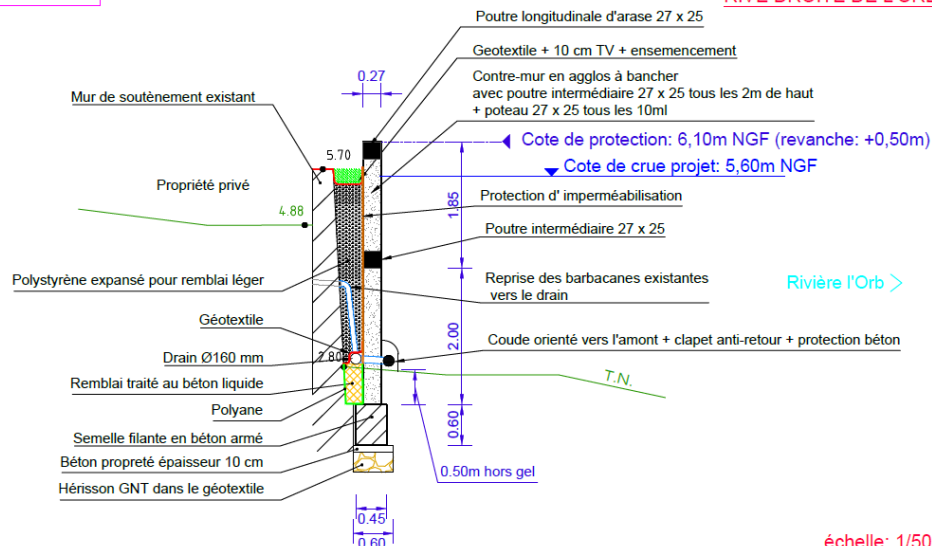

échelle: 1/50

Partenaires financiers des opérations



## Protection rapprochée de Sérignan tranche n°2

1. Marché attribué à RAZEL-BEC : 1 768 000 € HT
2. Maîtrise d'œuvre (prestataire agréé au titre des ouvrages classés) :  
ARTELIA
3. Coordonnateur SPS TECHNIBAT



## Protection rapprochée de la commune de Sérignan : T2




## Protection rapprochée de la commune de Sérignan : T2



# Protection rapprochée de Sérignan tranche n°3

## Engagement de la dernière tranche opérationnelle :

Sur la base des éléments du PROJET ARTELIA de 2014, la dernière tranche opérationnelle de cette opération était évaluée à 2 400 000 € HT.

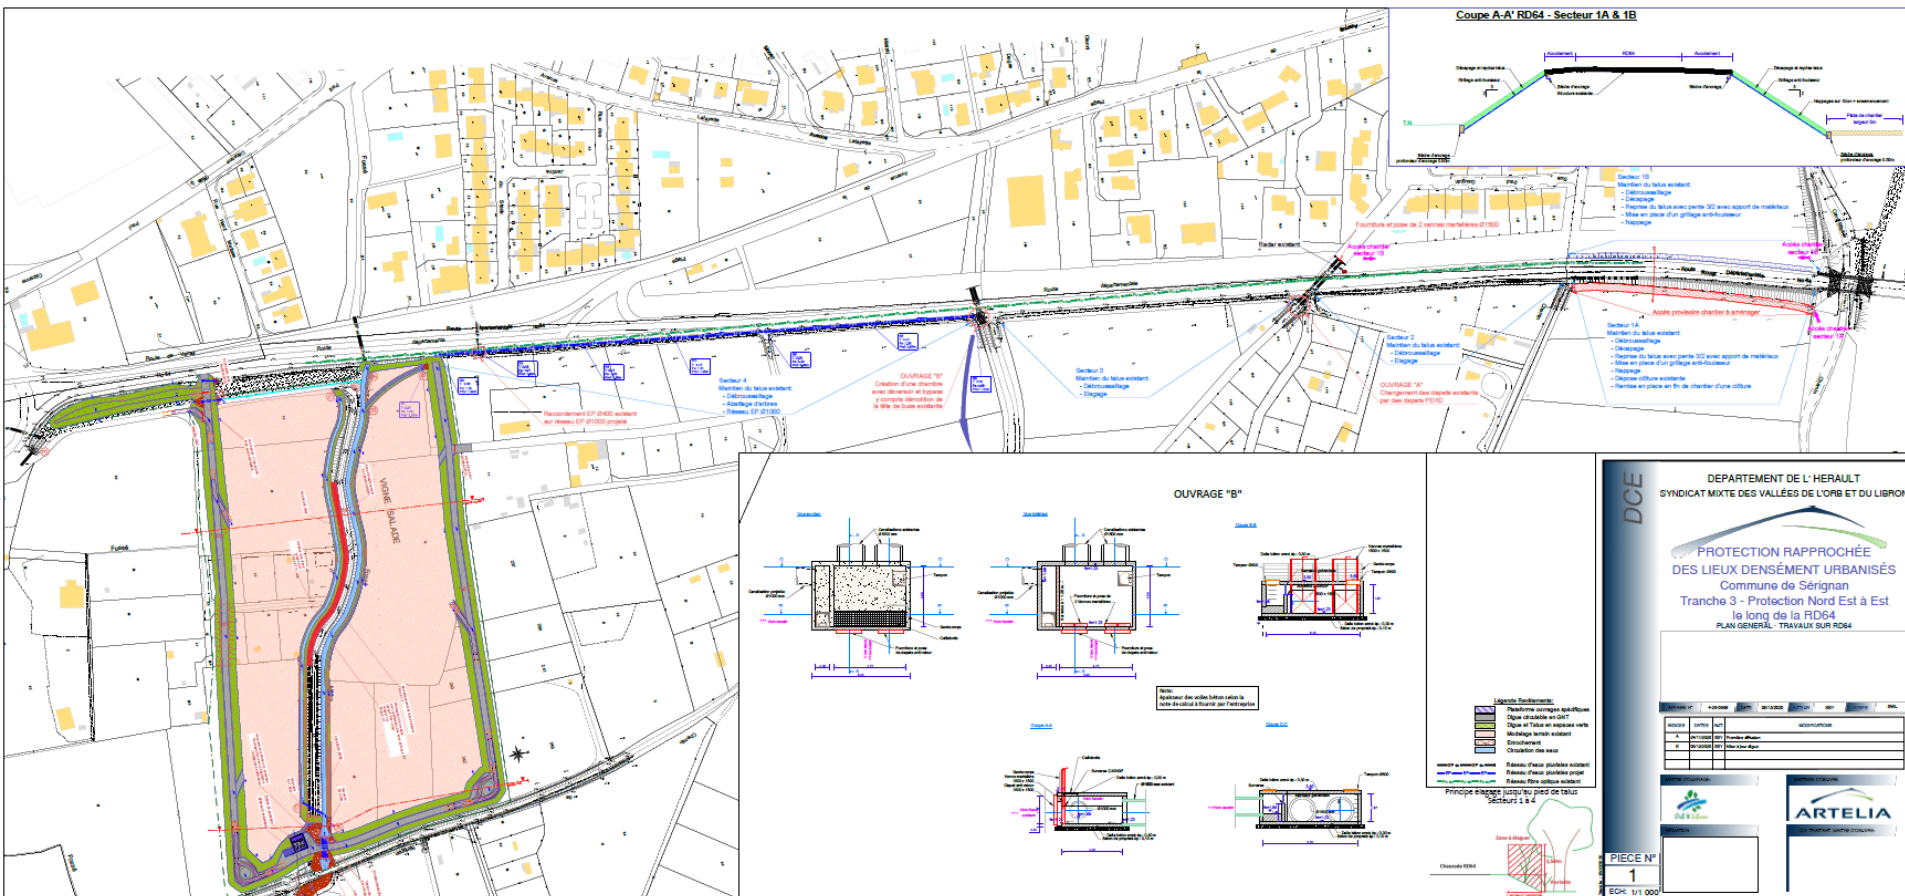

# Protection rapprochée de Sérignan tranche n°3

## Plan de financement :

- Etat : 40 % (acquis)
- CABM : 20 % (inscrits au budget 2020)
- CD 34 : 20 %
- Région Occitanie : 20 %

## Déroulement de l'opération :

- Constitution du DCE et mise en concurrence (Décembre 2020)
- Attribution en Février 2021 – Entreprise CAZAL 1,6 M €
- Ouverture du chantier en Avril 2021



# Protection rapprochée de Sérignan tranche n°3

## Engagement problématique, lourdes adaptations nécessaires :

- Fibre optique implantée par le CD 34 sur les emprises classées du chantier.
- Dévoisement impossible dans les délais et le budget de l'opération.
- Conception d'un nouveau système de collecte imposant de couper la RD 64, difficilement compatible avec l'activité touristique et les autorisations de voirie (règlement du CD34).

Franchissements impactant fortement la circulation routière.

Fibre optique implantée tout le long du tracé du by-pass hydraulique,

## Les grands terrassements :



## Les grands terrassements :



## Les fouilles de la station de pompage:



# Protection rapprochée de la commune de Sérignan : T3


## L'assemblage de la station de pompage:



**Lamberton**  
Cazal  
Sérignan  
Ouvrage CAV-1  
Poids Total :  
**20.000 Tonnes**  
Crochet 20.0<sup>r</sup>  
Chaîne : 4 Brins  
Réglable  
Lg: 8.00 m Mini  
**Attention**



## Les travaux sous la RD 64 :

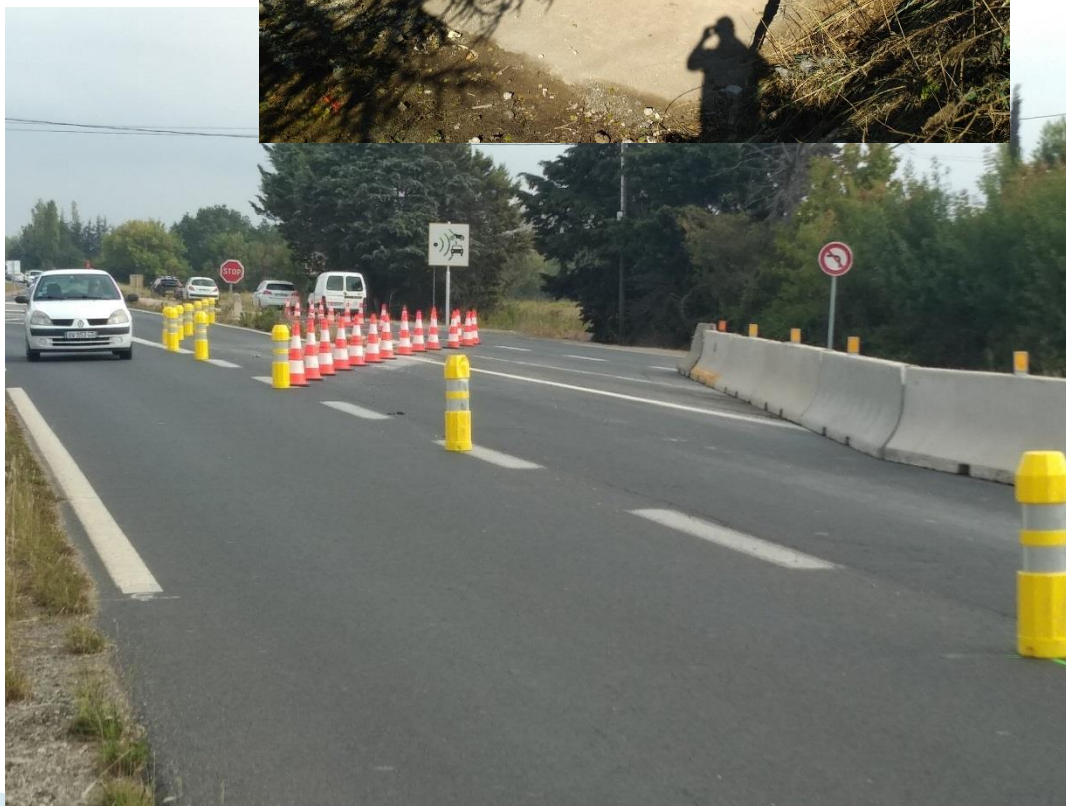

# Protection rapprochée de Sérignan tranche n°3

## Déroulement des suites de l'opération :

- Pose du D1000 sous la RD 64 et la route de Valras (Octobre)
- Pose des grillages anti-fouisseurs et nappage des digues en terre végétale (Octobre)
- Equipement électromécanique de la station de pompage en (Novembre)
- Traitement des talus de la RD 64 (Novembre)
- O.P.R Décembre 2021

# Etablissement Public Territorial de Bassin Orb et Libron

**FIN DU DIAPORAMA**

Merci de votre attention
