



Point d'avancement de la Phase 2 du contrat de rivière Orb & Libron

CLE du 30 Janvier 2024



Contenu

- **Rappel du contenu du Contrat de Rivière 4 Orb et Libron (2020-2024)**
- **Avancement fin 2023**
- **Perspectives 2024**



Rappel du contenu du Contrat de Rivière 2020-2024 Orb Libron

Phase 1 du contrat de rivière (2020-2022) : principales conclusions du bilan

▶ Le Contrat de Rivière Orb-Libron 4 - 2020-2022 :

54 opérations pour ~14 M€

2020	2021	2022
3 564 680 €	9 093 700 €	1 487 333 €


▶ La stratégie retenue

- ▶ **Accompagner le besoin d'amélioration de la connaissance lié aux évolutions de la maîtrise d'ouvrage (assainissement, AEP)**
- ▶ **Résoudre les difficultés identifiées de longue date et notamment celles inscrites au PDM (quantitatif, hydromorphologie)**
- ▶ **Encourager/poursuivre les actions novatrices et pilotes (toxiques, gestion du temps de pluie, phytosanitaires, adaptation au changement climatique)**
- ▶ **Poursuivre l'accompagnement du territoire par des animations dédiées**



Phase 1 du contrat de rivière (2020-2022) : principales conclusions du bilan

- ▶ Un **bilan globalement positif** avec :
 - ▶ Un engagement de **9,4 M d'€ soit 66%** du montant programmé sur 2020-2022. *La non réalisation d'actions portées par des maîtres d'ouvrages privés du volet continuité et estimées à 4 M d'€ justifie ce résultat : hors continuité le taux d'engagement atteint 93%.*
 - ▶ En nombre d'actions, **83 % des actions programmées ont été engagées** et plus de la moitié d'entres elles sont terminées.

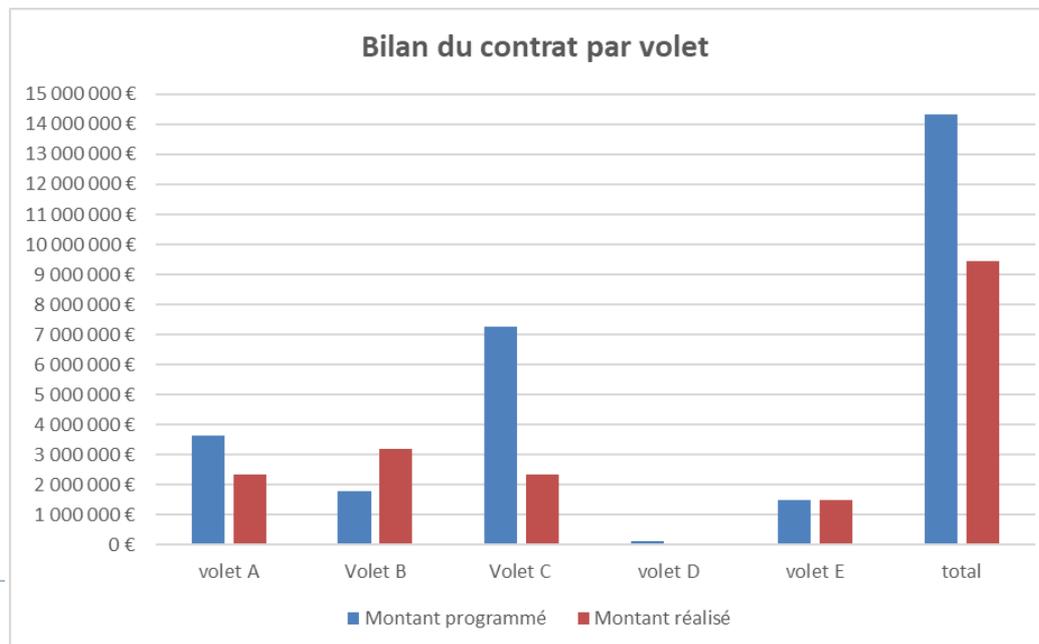

5 volets :

- ▶ A - Préservation de la qualité des eaux
- ▶ B- Gestion quantitative de la ressource en eau
- ▶ C- Préservation des cours d'eau et des milieux
- ▶ D- Adaptation au changement climatique
- ▶ E- Animation / mise en œuvre opérationnelle

Phase 2 : 2023-2024

- ▶ **Un programme riche de 55 actions pour un montant d'environ 37 M € (~10 M€ hors opération temps de pluie CABM)**

2023	2024
5 787 559 €	4 235 639 € 31 235 639 € <i>avec opération CABM</i>

- ▶ **Un programme ambitieux malgré une durée courte (<2ans)**
- ▶ **Des réponses aux problématiques identifiées par le PDM**
- ▶ **Des actions emblématiques (morphologie du Libron, gestion du temps de pluie, plan de gestion du delta de l'Orb) que le contrat permet de mettre en œuvre**
- ▶ **Des actions novatrices et pilotes** (gestion des espèces exotiques, adaptation au changement climatique) issues de la première phase du contrat
- ▶ **La poursuite des animations thématiques garantes de l'efficacité du contrat.**

Le programme d'actions 2023-2024

Volet	Sous Volet	Nombre de fiches d'actions
A – Préservation de la qualité	Assainissement et Gestion du temps de pluie	2
	Pollutions par les phytosanitaires	3
	Pollutions par les toxiques	1
B – Gestion quantitative	Gestion de l'Eau Potable	1
	Gestion de l'Eau Brute	1
	Amélioration de la connaissance	1
C – Préservation et restauration des Milieux	Continuité écologique	1
	Gestion de la ripisylve	2
	Restauration morphologique des cours d'eau	3
	Zones humides	1
D – Contribution à l'adaptation au Changement Climatique		2
E – Animation du contrat de rivière		1
Total		19

	Volet A	Volet B	Volet C	Volet D	Volet E	Total
Montant programmé	31 903 000 €	570 000 €	2 842 317 €	737 272 €	970 609 €	37 023 198 €





Avancement fin 2023 de la phase 2 du Contrat de Rivière 2020-2024 Orb Libron

Volet A Préservation de la qualité des eaux

Opération	Maître d'ouvrage	Typologie	Coût € HT	N° fiche action	Avancement
Réhabilitation réseaux EU traversée Laurens Tranche 2	SI Mare et Libron	travaux	pm	A1	En cours
Résorption des rejets individuels diffus sur l'îlot Port Neuf à Béziers	CABM	travaux	600 000 €		En cours
Etude de faisabilité d'opérations de désimperméabilisation sur des secteurs prioritaires (réseaux unitaires raccordés à la STEP de Béziers)	CABM	étude	50 000 €	A2	En cours
Délimitation de l'aire d'alimentation du captage prioritaire Creissan	Creissan	étude	70 000 €	A3	Plan de financement à boucler
Délimitation de l'aire d'alimentation du captage prioritaire Perdiguier	SIVOM Ensérune	étude	70 000 €		Report 2024
Bouchage des piézomètres ou forages non utilisés sur l'AAC du Libron et les zones de sauvegarde de la nappe alluviale de l'Orb	CABM	travaux	120 000 €	A4	En cours
Mise en place d'un traitement des pesticides sur les communes de Puimisson-Puissalicon	CCAM	travaux	2 921 000 €	A5	En cours
Mise en œuvre du plan d'actions rejets industriels et toxiques	CABM - acteurs économiques	étude et travaux	182 000 €	A6	Poursuite du travail d'animation mais pas d'opérations engagées en 2023

Volet B Gestion quantitative de la ressource en eau

Opération	Maître d'ouvrage	Typologie	Coût € HT	N° fiche action	Avancement
PGRE - Travaux béals du Jaur (béal de Courniou)	Béal de Courniou	travaux	30 000 €	B8	Dépôt demande subvention 1er trimestre 2024
PGRE - Travaux béals du Jaur (béal de la SCI Chalion)	SCI Chalion	travaux	20 000 €		Dépôt demande subvention 1er trimestre 2024
PGRE - Travaux béals du Jaur	M Massart	travaux	40 000 €		Projet ayant évolué
PGRE - Travaux béals du Jaur	SCI nouveau Martinet	travaux	20 000 €		Report 2024
PGRE - Travaux béals du Vernazobre (béal de la mairie)	ASA Illouvre Vernazobres	travaux	15 000 €		Dépôt demande subvention 1er trimestre 2024

Volet C Préservation des cours d'eau et des milieux

Opération	Maître d'ouvrage	Typologie	Coût € HT	N° fiche action	Avancement
Analyse de l'évolution du profil en-long (du pont Gaston Doumergue à Béziers)	EPTB OL	étude	50 000 €	C10	validation subvention en cours
Analyse de l'attractivité des passes à poissons du Moulin de Saint Pierre et Pont Rouge et préconisations	OFB	étude	pm		Réalisé
Topographie complémentaire sur les 5 passes à poissons	EPTB OL	étude	10 000 €		Report 2024
Plan pluriannuel d'entretien des berges CCAM	EPTB OL	travaux	82 000 €	C11	validation subvention en cours
Plan pluriannuel d'entretien des berges CCLD	EPTB OL	travaux	30 000 €		validation subvention en cours
Plan pluriannuel d'entretien des berges CCGO	CCGO	travaux	300 000 €		Réalisé
Plan pluriannuel d'entretien des berges CAHM	CAHM	travaux	30 000 €		Sans Objet
Plan pluriannuel d'entretien des berges CCMC	CCMC	travaux	115 000 €		validation subvention en cours
Plan pluriannuel d'entretien des berges Lirou, Vernazobre, Orb - CESH	EPTB OL	travaux	70 000 €		validation subvention en cours
Plan pluriannuel d'entretien des berges de l'Orb - CABM	EPTB OL	travaux	150 000 €		validation subvention en cours
Mise en œuvre du plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes -communication	EPTB OL	étude	30 000 €	C12	Report 2024 ?
Mise en œuvre du plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes - lutte contre la Berce	CCGO	travaux	40 000 €		Réalisé sans demande de subvention
Mise en œuvre du plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes - Limitation des déplacements des populations d'écrevisses exotiques sur les secteurs favorables aux populations d'écrevisses à pattes blanches	EPTB OL	travaux	12 000 €		Report 2024 ?
Mise en œuvre du plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes - Opération renouée	CCGO	travaux	20 000 €		Report 2024
Compléments au plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes - Inventaire de la population de Cistudes secteur step Cazedarnes et moyenne vallée	EPTB OL	étude	14 950 €		Réalisé
Accompagnement / Mise en œuvre étude espace de bon fonctionnement Orb et Libron	EPTB OL	étude	30 000 €		C15
Mise en œuvre plan de gestion du Delta -travaux de restauration hydraulique des fossés structurants tranche 1 - Sérignan	ASA Sérignan	travaux	85 000	C16	En cours
Mise en œuvre plan de gestion du Delta - travaux de restauration hydraulique des fossés structurants tranche 1 - Portiragnes	ASA Portiragnes	travaux	85 000		En cours

Volet D Contribution à l'adaptation au changement climatique

Aucune action programmée en 2023 sur le volet D.

Pour autant des actions engagées en ce sens sur le territoire :

- AMI eau et changement climatique : réflexion sur le Faugérois et le delta de l'Orb portée par l'EPTB Orb Libron en partenariat avec les acteurs professionnels (mise en œuvre 2024-2025)
- des projets communaux de désimperméabilisation des cours d'école (Béziers, Bédarieux) bien engagés
- cahiers des charges réalisés pour les études CABM « potentiel de désimperméabilisation des secteurs unitaires » volet A et EPTB « effets du changement climatique sur la disponibilité de la ressource en eau » volet B.



Volet E Animation

Opération	Maître d'ouvrage	Typologie	Coût € HT	N° fiche action	Avancement
Animation Zones humides, restauration hydromorphologique et continuité (1 ETP)	EPTB OL	animation	54 000 €	E19	Réalisé
Animation Captages prioritaires Libron et Murviel (1 ETP)	EPTB OL		38 000 €		Réalisé partiellement
Animation Captages prioritaires Puisserguier	Puisserguier		35 000 €		Réalisé
Animation agri-environnementale Orb Libron en lien avec les captages prioritaires	EPTB OL		54 000 €		Réalisé
Animation restauration hydromorphologique et entretien des berges (1 ETP)	EPTB OL		52 000 €		Réalisé
Poursuite animation rejets industriels	CABM		45 609 €		Réalisé
Animation PGRE volet Eau brute + suivi des étiages (1 ETP)	EPTB OL		41 000 €		Réalisé
Animation PGRE Volet AEP (1/2 ETP)	EPTB OL		20 000 €		Réalisé
Animation SAGE, inter SAGE, lien avec l'urbanisme (1 ETP)	EPTB OL		91 000 €		Réalisé
Pilotage contrat de rivière et animation programme d'action (1 ETP)	EPTB OL		65 000 €		Réalisé

Synthèse fin 2023

Un bon niveau d'engagement des actions programmées

	Montant	Avancement /programmation	Nombre d'opérations	Avancement /programmation
Engagé fin 2023	5 611 559 €	97%	31	76%

Malgré du retard dans la mise en œuvre (plan de subvention à boucler, validation technique à obtenir...). Seules 50% des actions sont terminées (environ 1 million d'euros).

Efficacité au regard des objectifs du PDM:

Sur les 41 actions programmées en 2023, 17 répondent directement aux enjeux du PDM et parmi elles :

- 11 sont engagées,
- 5 sont définies techniquement et les demandes de subvention seront faites au 1er trimestre 2024 (étude Bac Perdiguier, travaux béals Jaur/Vernazobre)
- 1 doit être confirmée (travaux béal Jaur Mr Massart).



Synthèse fin 2023

Focus sur les aides exceptionnelles de l'Agence de l'Eau liées au contrat :

30% d'aides sur des opérations petit cycle de l'eau exclues du programme classique

Bénéficiaires : maitres d'ouvrage des opérations volet A (ici CABM et CCAM), au prorata des actions réalisées.

Consommation fin 2023 : 781 586 € soit 74% du montant prévu (1 054 000 €)

Mobilisé à 22% par la CABM et 78% par la CCAM

AEP	204 147 €	26%
EU- réseau	61 764 €	8%
EU- step	515 675 €	66%



Perspectives 2024



Perspectives 2024

- ▶ **En 2024, le contrat prévoit 36 opérations nouvelles.**
- ▶ **Ces actions sont globalement maintenues, à part :**
 - ▶ **L'opération Ressuyage des Orpellières Hautes financée par le PAPI**
 - ▶ **L'opération pose de compteurs du SI d'eau et d'assainissement Orb et Gravezon qui ne sera pas aboutie en 2024**
- ▶ **Des interrogations sur le respect du calendrier:**
 - ▶ **Projet CABM gestion du temps de pluie (bassin d'orage et réseaux)**
 - ▶ **Travaux de restauration de la morphologie du Libron, projet réorienté autour de sites pilotes**
 - ▶ **Travaux de restauration de la morphologie de l'Orb au Poujol, suite à l'étude en cours.**





Suivi de la Phase 2 du Contrat de Rivière 2020-2024 Orb & Libron

Merci de votre attention

